

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
ev.č. 8/13/0050

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění,
mezi:

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací
Masarykova 11, Liberec 1, 46001
zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem
bankovní spojení: KB Liberec
číslo účtu: 3231-461/0100
IČO: 00083232
dále jen zhotovitel

a

Statutárním městem Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupeným primátorkou Bc. Martinou Rosenbergovou
bankovní spojení: ČS, a.s.
číslo účtu: 4096302/0800
IČ: 262978
dále jen objednatel

Článek I.
PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akcích v Liberci (Liberecký kraj):
 - 1.1. „Lokalita Lesní ul. – II. etapa“, 1.část: ulice Lesní, Dvořákova, Purkyňova, Zborovská
 - 1.2. „Cyrila a Metoděje“
 - 1.3. „Luční“
 - 1.4. „Rumjancevova – vnitroblok“
 - 1.5. „Kostelní – II. etapa“
 - 1.6. „Proletářská“
 - 1.7. „Dělnická“
 - 1.8. „Chotyňská, Donínská“
 - 1.9. „Puškinova“

V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od **května 2013** do **listopadu 2013**.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur- daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je **2 483.700,- Kč**, z toho:

	58.000,- (Lesní II)
Lokalita Lesní – II. etapa – Lesní	20.200,-
Lokalita Lesní – II. etapa – Dvořákova	13.900,-
Lokalita Lesní – II. etapa – Purkyňova	8.500,-
Lokalita Lesní – II. etapa – Zborovská	15.400,-
Cyrila a Metoděje	32.000,-
Luční	29.000,-
Rumjancevova – vnitroblok	33.800,-
Kostelní – II. etapa	2 188.600,-
Proletářská	32.000,-
Dělnická	32.000,-
Chotyňská, Donínská	44.500,-
Puškinova	33.800,-

2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č.2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, přísp. org. není plátcem DPH, uvedená cena je konečná.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Fakturace nákladů na záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) bude provedena odděleně pro každou jednotlivou akci.
2. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Nejpozději s předáním závěrečné zprávy objednateli mu bude zhotovitelem vydána konečná faktura.
4. Splatnost faktur- daňových dokladů se sjednává na 30 dní od jejího doručení objednateli.
5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
7. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu sídla objednatele. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Záchranný archeologický výzkum při akcích uvedených v čl. I,1 této dohody, v rozsahu definovaném v příloze č.1, proběhne zčásti dohledem a zčásti jako plošný odkryv dotčené plochy. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skryvku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zástupce zhotovitele, a to na základě předchozí dohody s pověřeným zaměstnancem objednatele.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického výzkumu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální zázemí a dále poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, pro uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů (např. mobilních kontejnery, WC). Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel. Objednatel zajistí také plochu pro provoz plavící linky.
7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
8. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Petr Brestovanský (tel. 739572466, e-mail petr.brestovansky@seznam.cz)

9. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Václav Bahník (tel. 602411278, e-mail bahnik.vaclav@magistrat.liberec.cz)

Článek VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací.
3. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

Článek VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. I.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Za nerealizované akce nebude zhotovitelem požadována žádná úhrada.
7. Tato dohoda byla schválena usnesením rady města Liberec č. 317 ze dne 7.5.2013.

8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy:

1. Situační plán akce a výpis z katastru nemovitostí pozemku
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Za objednatele:


Bc. Martina Rosenbergová
primátorka



V LIBERCI dne


Za zhotovitele:


Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci,
přísp. org.



V LIBERCI dne 2. 5. 2013
č.j. 1019/2013

DVORÁČOVA

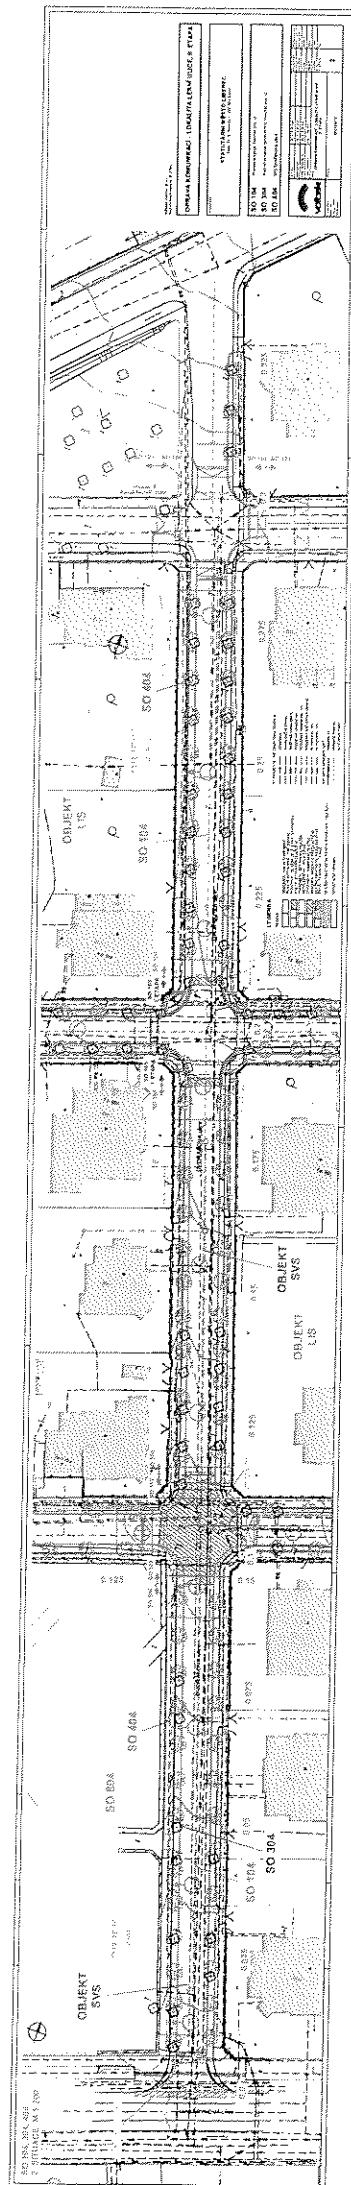

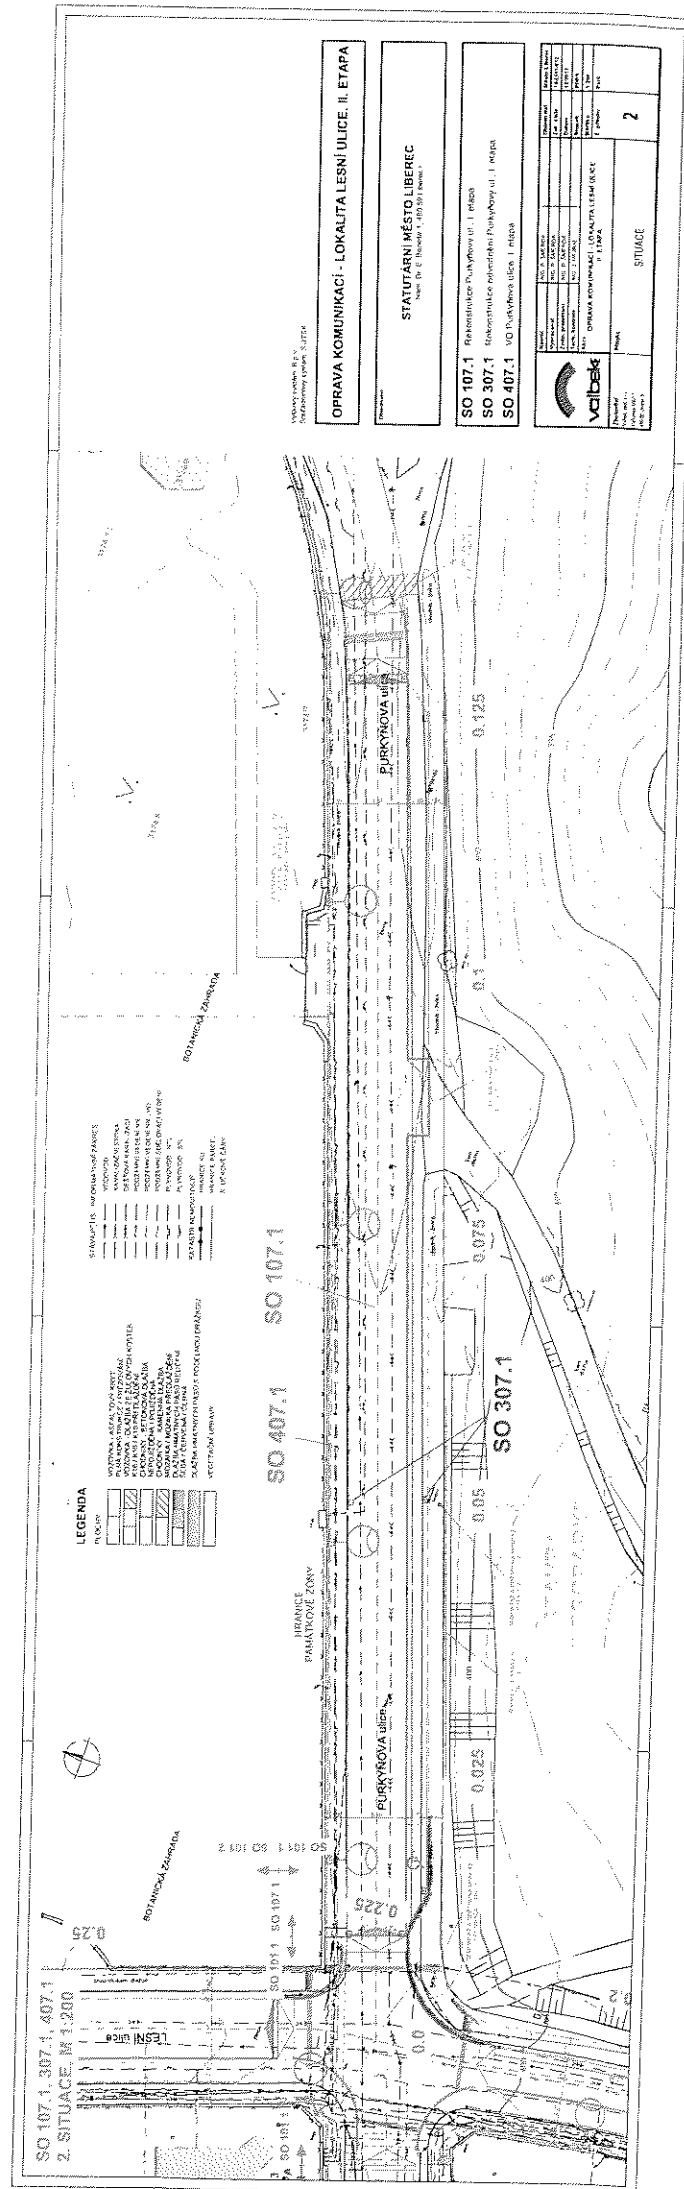

PRÍLOHA 1
PURKYNĚOVA I. et

OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE II. ETAPA


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

SO 107.1 Reprojektace Purkyněovy ul. I. etapy
SO 307.1 Rekonstrukce podjezdu Purkyněovy ul. I. etapy
SO 407.1 Úprava Purkyněovy ulice I. etapy


STUŽKA

2


ZBOROVSKÁ 2.1

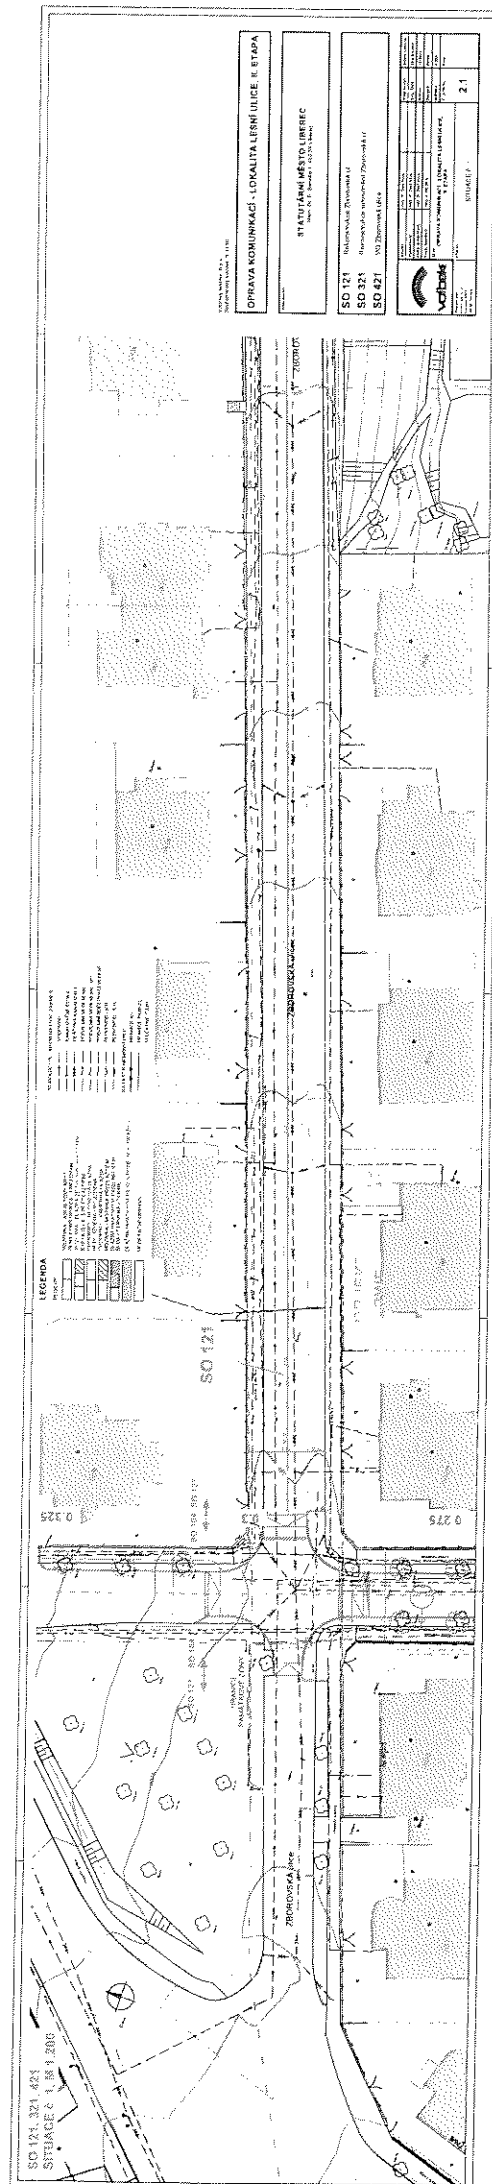

CYRILA A METODĚJE - LIBEREC

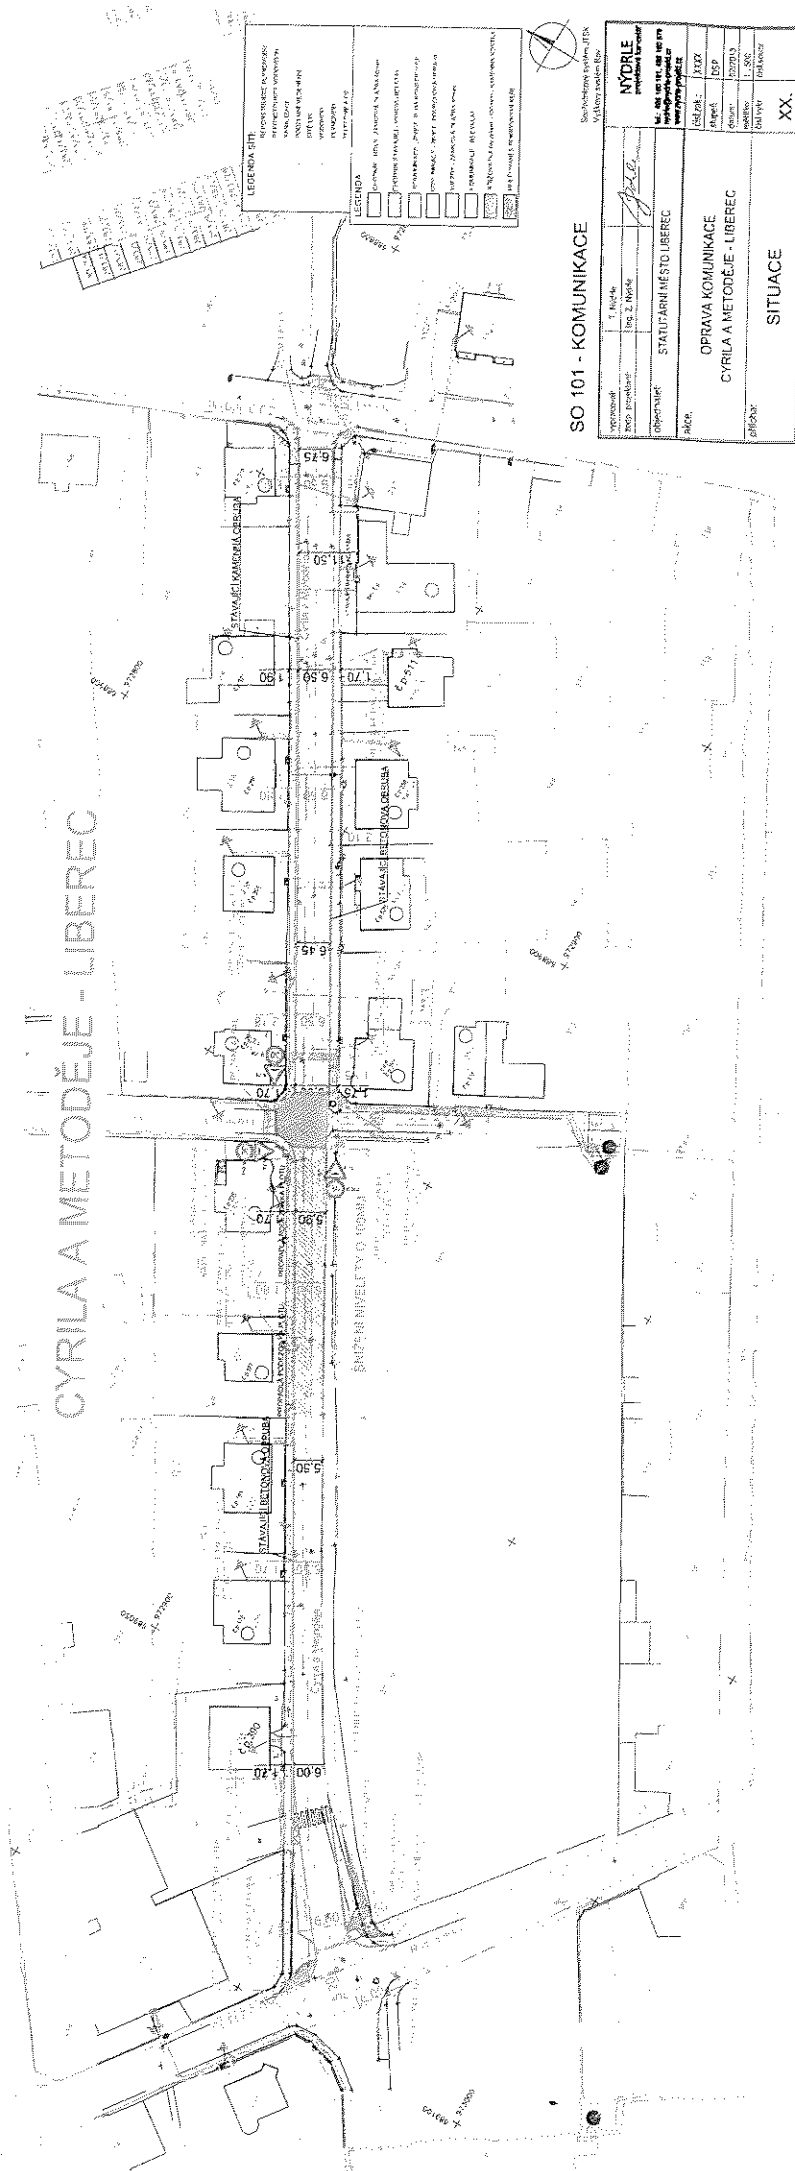

PRÍLOHA 1
 CYRILA
 A METODĚJE

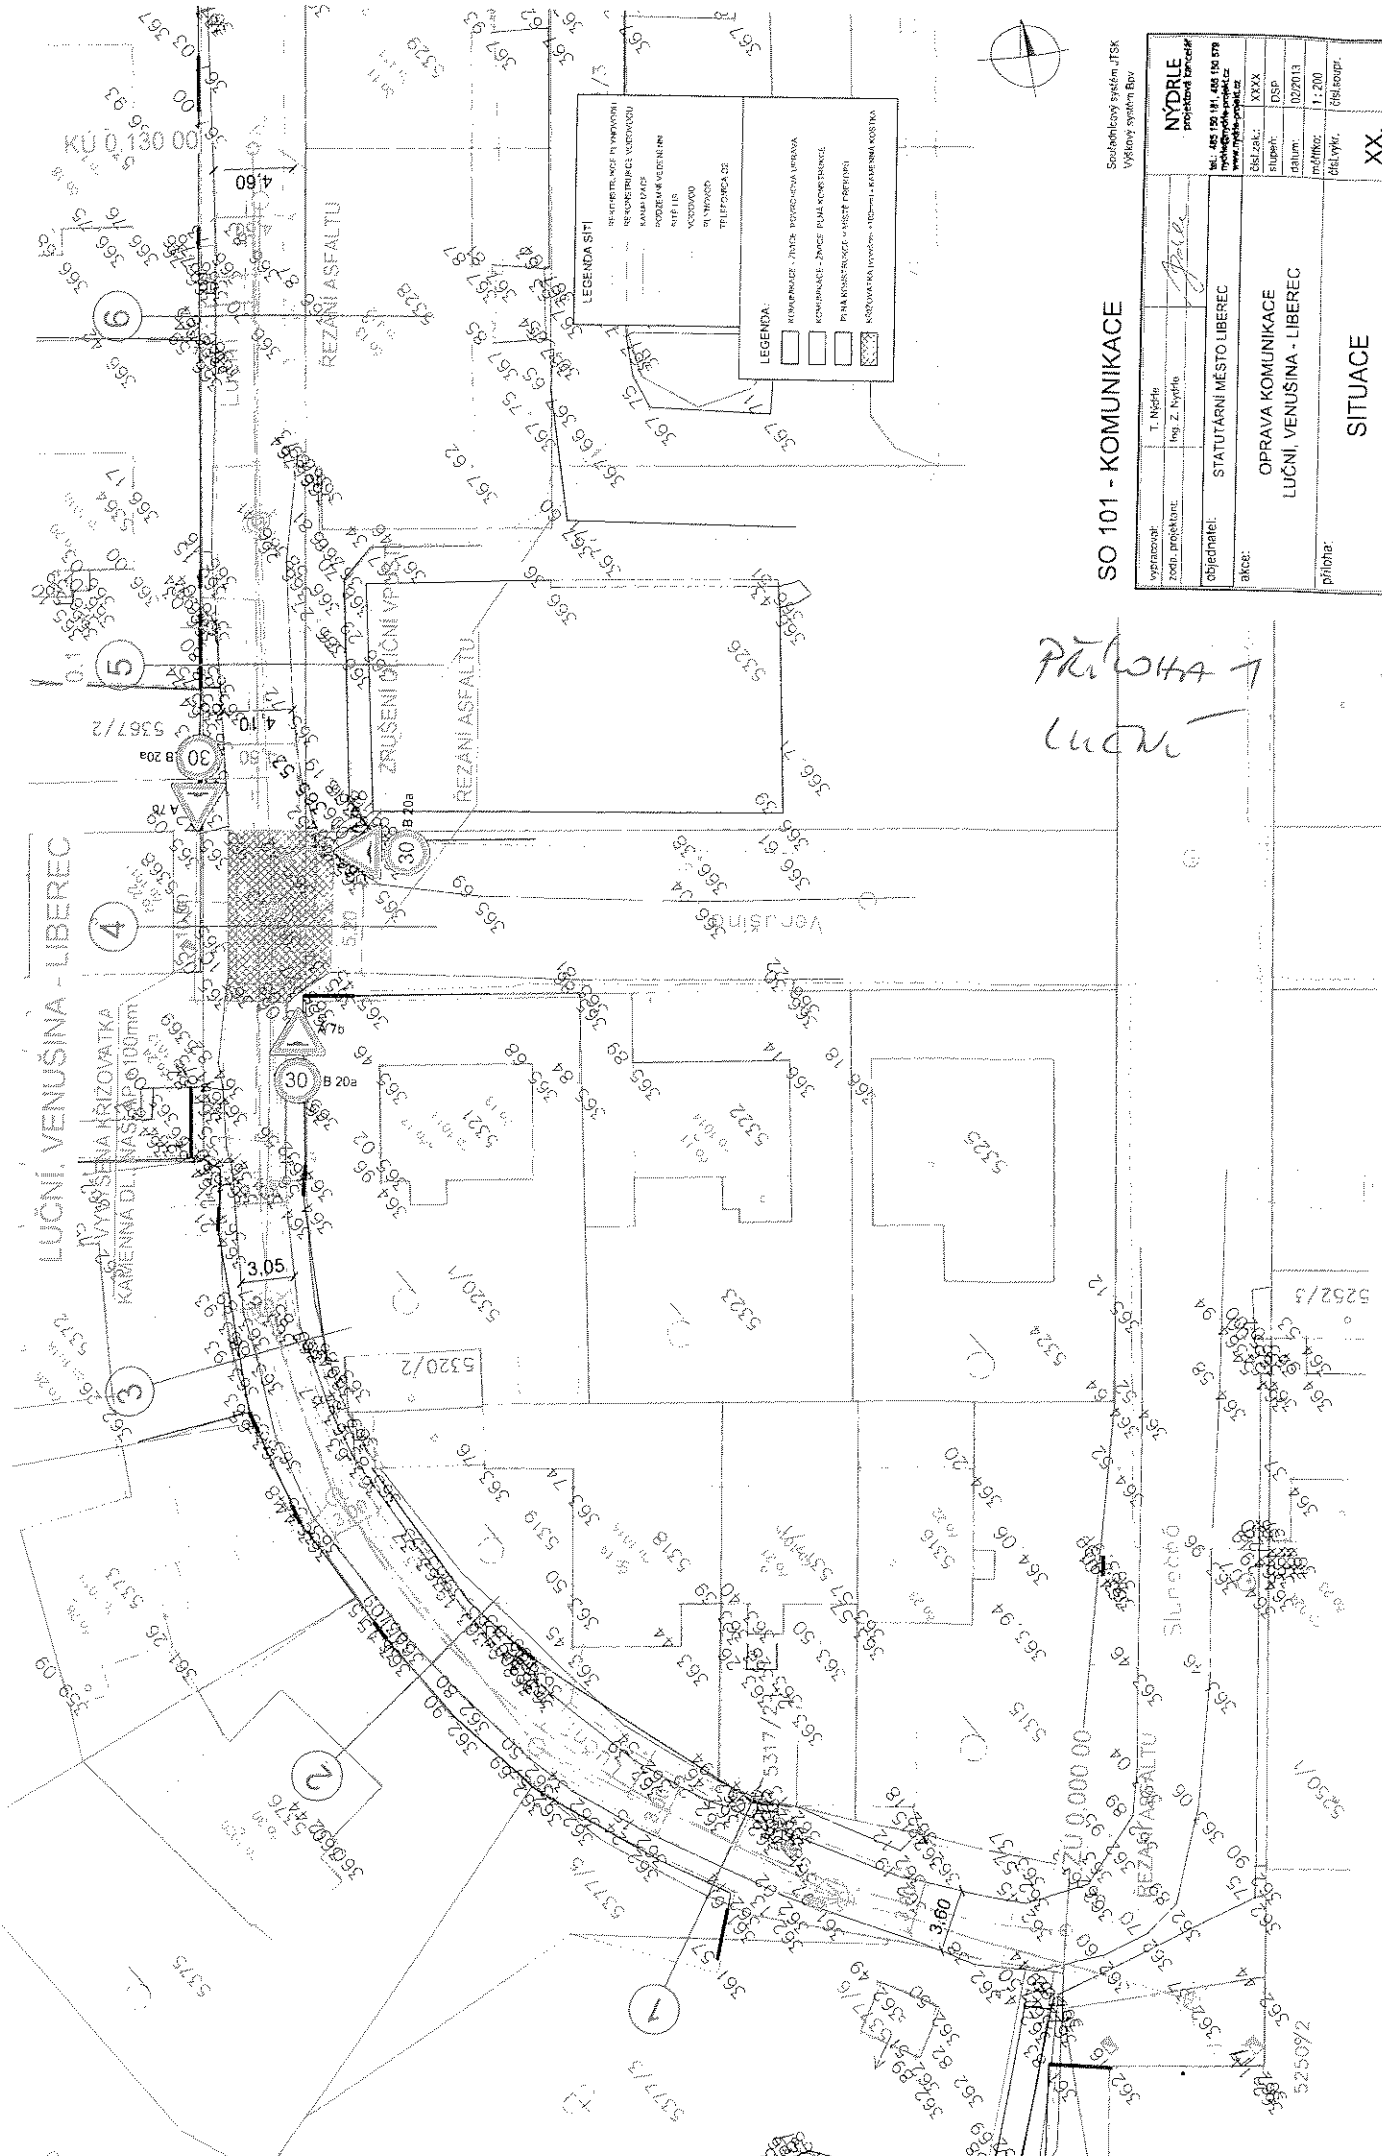

Soudřadný systém JTSK
Výškový systém Bv

SO 101 - KOMUNIKACE

NYDRLE projektová kancelář tel. 482 150 181, 482 150 179 fax 482 150 180 www.nydrleprojekt.cz		T. Nydrle Ing. Z. Nydrle
vypracoval: zkontroloval: objednatel: akce:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC OPRAVA KOMUNIKACE LUČNÍ, VENUŠINA - LIBEREC	XX.
příloha:		číslo:

Příloha 1
Luční


Будущее поколение

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

podpis: <i>[Signature]</i>	T. Křivánek Mgr. J. Křivánek	NYDRLE PROJEKTOVÁNÍ A STAVBY PROJEKTOVÁNÍ A STAVBY Na území č. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
----------------------------	---------------------------------	--

[illegible][illegible]

Welcome

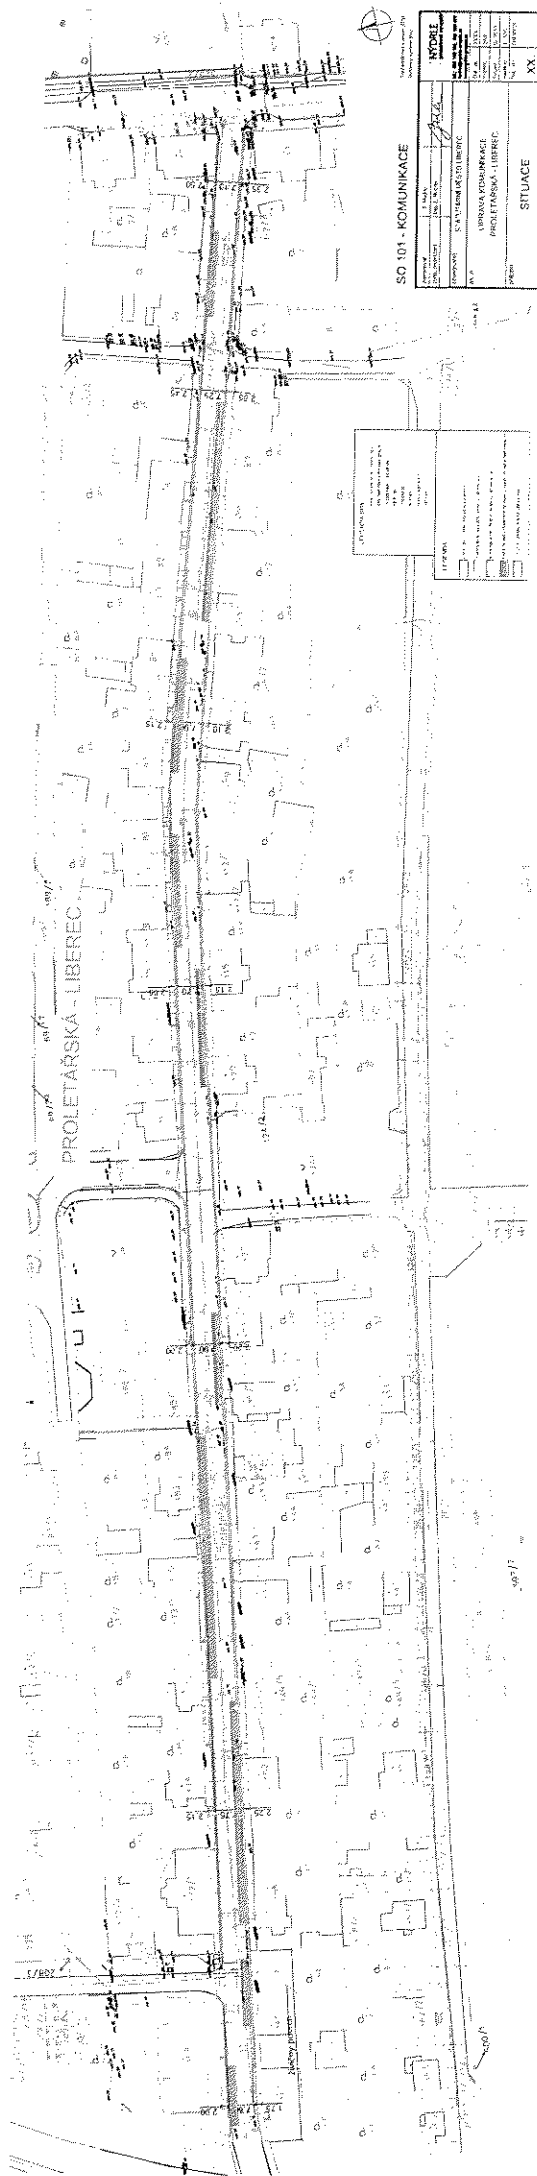

SO 101 - KOMUNIKACE


MOŽE		XX	
1. ÚZEMNÍ	2. ÚZEMNÍ	3. ÚZEMNÍ	4. ÚZEMNÍ
5. ÚZEMNÍ	6. ÚZEMNÍ	7. ÚZEMNÍ	8. ÚZEMNÍ
9. ÚZEMNÍ	10. ÚZEMNÍ	11. ÚZEMNÍ	12. ÚZEMNÍ
13. ÚZEMNÍ	14. ÚZEMNÍ	15. ÚZEMNÍ	16. ÚZEMNÍ
17. ÚZEMNÍ	18. ÚZEMNÍ	19. ÚZEMNÍ	20. ÚZEMNÍ
21. ÚZEMNÍ	22. ÚZEMNÍ	23. ÚZEMNÍ	24. ÚZEMNÍ
25. ÚZEMNÍ	26. ÚZEMNÍ	27. ÚZEMNÍ	28. ÚZEMNÍ
29. ÚZEMNÍ	30. ÚZEMNÍ	31. ÚZEMNÍ	32. ÚZEMNÍ
33. ÚZEMNÍ	34. ÚZEMNÍ	35. ÚZEMNÍ	36. ÚZEMNÍ
37. ÚZEMNÍ	38. ÚZEMNÍ	39. ÚZEMNÍ	40. ÚZEMNÍ
41. ÚZEMNÍ	42. ÚZEMNÍ	43. ÚZEMNÍ	44. ÚZEMNÍ
45. ÚZEMNÍ	46. ÚZEMNÍ	47. ÚZEMNÍ	48. ÚZEMNÍ
49. ÚZEMNÍ	50. ÚZEMNÍ	51. ÚZEMNÍ	52. ÚZEMNÍ
53. ÚZEMNÍ	54. ÚZEMNÍ	55. ÚZEMNÍ	56. ÚZEMNÍ
57. ÚZEMNÍ	58. ÚZEMNÍ	59. ÚZEMNÍ	60. ÚZEMNÍ
61. ÚZEMNÍ	62. ÚZEMNÍ	63. ÚZEMNÍ	64. ÚZEMNÍ
65. ÚZEMNÍ	66. ÚZEMNÍ	67. ÚZEMNÍ	68. ÚZEMNÍ
69. ÚZEMNÍ	70. ÚZEMNÍ	71. ÚZEMNÍ	72. ÚZEMNÍ
73. ÚZEMNÍ	74. ÚZEMNÍ	75. ÚZEMNÍ	76. ÚZEMNÍ
77. ÚZEMNÍ	78. ÚZEMNÍ	79. ÚZEMNÍ	80. ÚZEMNÍ
81. ÚZEMNÍ	82. ÚZEMNÍ	83. ÚZEMNÍ	84. ÚZEMNÍ
85. ÚZEMNÍ	86. ÚZEMNÍ	87. ÚZEMNÍ	88. ÚZEMNÍ
89. ÚZEMNÍ	90. ÚZEMNÍ	91. ÚZEMNÍ	92. ÚZEMNÍ
93. ÚZEMNÍ	94. ÚZEMNÍ	95. ÚZEMNÍ	96. ÚZEMNÍ
97. ÚZEMNÍ	98. ÚZEMNÍ	99. ÚZEMNÍ	100. ÚZEMNÍ

PRŮLOHA 1
PROLETÁŘSKÁ

[illegible][illegible]

ПРИЛОЖА 7

ПУТКИНОВА 1. ЕТАЖ

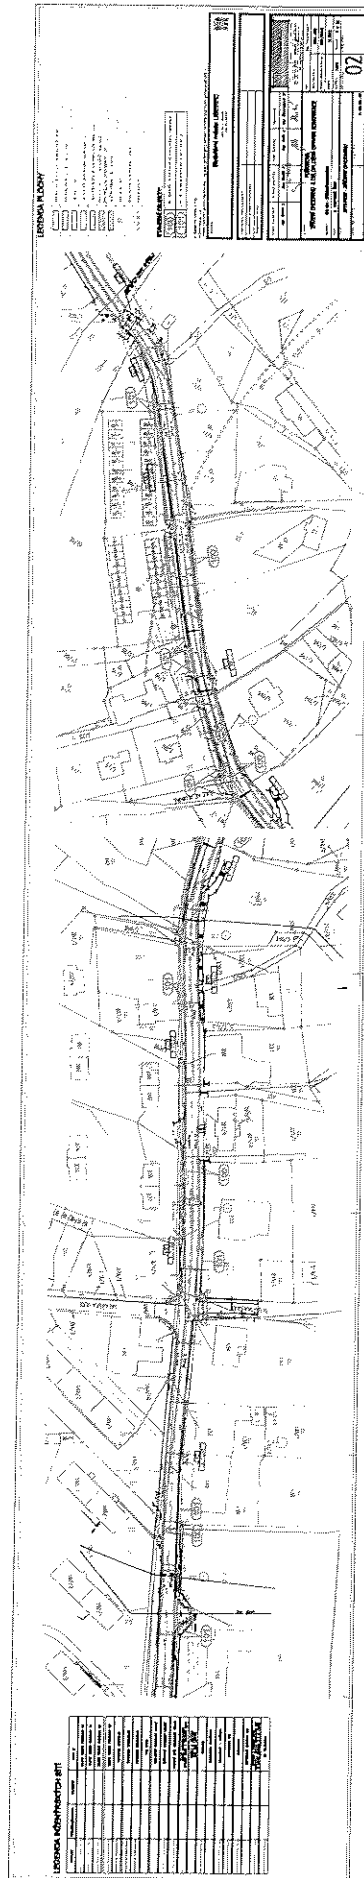

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Lokalita Lesní- II. etapa, 1. část: Lesní“, Liberec, (Liberecký kraj);
(640 m)

realizace 05-11/2013

Investor:
.....
zastoupený

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 21.4.2013)

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	24	10 800, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	4	1 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	12	3 600, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	4	1 200, 00 Kč
				17 400, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	800, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	2000, 00 Kč
			2800, 00 Kč

práce archeologů	17 400,- Kč
laboratorní práce a materiál	2 800,- Kč
Celková částka	20 200,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

V Liberci 21.4.2013

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Lokalita Lesní- II. etapa, 1. část: Dvořákova“, Liberec, (Liberecký kraj);
(280 m)

realizace 05-11/2013

Investor:
.....
zastoupený

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 21.4.2013)

(konečné ceny – SČ.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	14	6 300, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	4	1 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	6	1 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	4	1 200, 00 Kč
				11 100, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	800, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	2000, 00 Kč
			2800, 00 Kč

práce archeologů	11 100,- Kč
laboratorní práce a materiál	2 800,- Kč
Celková částka	13 900,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Lokalita Lesní- II. etapa, 1. část: Purkyňova“, Liberec, (Liberecký kraj);
(130 m)

realizace 05-11/2013

Investor:
.....
zastoupený

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 21.4.2013)

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	6	2 700, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	4	1 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	4	1 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	4	1 200, 00 Kč
				6 900, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	600, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	1000, 00 Kč
			1600, 00 Kč

práce archeologů	6 900,- Kč
laboratorní práce a materiál	1 600,- Kč
Celková částka	8 500,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

V Liberci 21.4.2013

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

**Akce: „Lokalita Lesní- II. etapa, 1. část: Zborovská“, Liberec, (Liberecký kraj);
(415 m)**

realizace 05-11/2013

Investor:
.....
zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 21.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	16	7 200, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	4	1 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	8	2 400, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	4	1 200, 00 Kč
				12 600, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	800, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	2000, 00 Kč
			2800, 00 Kč

práce archeologů	12 600,- Kč
laboratorní práce a materiál	2 800,- Kč
Celková částka	15 400,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Cyrila a Metoděje“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od 06/2013

Investor:
.....
zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 9.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	16	7 200, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	16	7 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	16	4 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	16	4 800, 00 Kč
				24 000, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	5000, 00 Kč
			8 000, 00 Kč

práce archeologů	24 000,- Kč
laboratorní práce a materiál	8 000,- Kč
Celková částka	32 000,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Luční“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od 06/2013

Investor:
.....
zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 9.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	14	6 300, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	14	6 300, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	14	4 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	14	4 200, 00 Kč
				21 000, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	5000, 00 Kč
			8 000, 00 Kč

práce archeologů	21 000,- Kč
laboratorní práce a materiál	8 000,- Kč
Celková částka	29 000,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Rumjancevova- vnitroblok“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od 07/2013

Investor:
.....
zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 9.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	20	9 000, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	16	7 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	16	4 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	16	4 800, 00 Kč
				25 800, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	5000, 00 Kč
			8 000, 00 Kč

práce archeologů	25 800,- Kč
laboratorní práce a materiál	8 000,- Kč
Celková částka	33 800,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Kostelní-II. etapa“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od 05/2013

Investor:
.....
zastoupený

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum (k 9.4.2013)

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

práce v terénu (subd.)				
Funkce (výkon)	poč. prac.	prům.hod. sazba	poč. dnů po 8 hod	celkem
specialista archeologického výzkumu (technik)	3	290	42	292 320, 00 Kč
pracovník archeologického výzkumu (kopáč, preparátor, pracovníci plavící linky)	9	170	42	514 080, 00 Kč
				806 400, 00 Kč

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. dnů po 8 hod	celkem
archeolog (terén)	1	450	15	54 000, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	30	108 000, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	15	36 000, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	8	19 200, 00 Kč
				217 200, 00 Kč

Laboratorní práce a materiál			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	30000, 00 Kč
2	geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků/spektr. analýza (kovy)	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	60000,00 Kč
3	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	20000, 00 Kč

4	geodetické zaměření	polohopis a výškopis objektů	90000, 00 Kč
5	historická rešerše a SHP zaniklých konstrukcí		70000, 00 Kč
6	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, kreslení nálezů	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	120000, 00 Kč
7	laboratorní ošetření a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kovů, kostí, skla, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace),	80000, 00 Kč
8	spektrální analýza kovy (devocionálie)		15000, 00 Kč
9	odborná konzervace organických materiálů, dřeva, textilu, kůže		65000, 00 Kč
10	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	20000, 00 Kč
11	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0
12	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza	40000, 00 Kč
13	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0
14	osteologický rozbor a antropologický rozbor (DNA, mt DNA apod.)	zvířecí kosti, lidské ostatky	400000, 00 Kč
15	parazitologický rozbor		30000, 00 Kč
16	geofyzikální metody (magnetometrie, georadar apod.)	detekce objektů	50000, 00 Kč
17	informační tabule	informace o výzkumu	5000, 00 Kč
18	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		50000, 00 Kč
19	letecké snímkování lokality		0 Kč
20	nájmy	malý sondážní bagr	5000 Kč
21	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	15000, 00 Kč
			1 165 000, 00 Kč

práce techniků a kopáčů	806 400,- Kč
práce archeologů	217 200,- Kč
laboratorní práce a materiál	1 165 000,- Kč
Celková částka	2 188 600,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlib.cz
tel.: 739572466

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Proletářská“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od 07/2013

Investor:
.....
zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 9.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	16	7 200, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	16	7 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	16	4 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	16	4 800, 00 Kč
				24 000, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	5000, 00 Kč
			8 000, 00 Kč

práce archeologů	24 000,- Kč
laboratorní práce a materiál	8 000,- Kč
Celková částka	32 000,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

V Liberci 9.4.2013

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Dělnická“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od 07/2013

Investor:
.....
zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 9.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	16	7 200, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	16	7 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	16	4 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	16	4 800, 00 Kč
				24 000, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	5000, 00 Kč
			8 000, 00 Kč

práce archeologů	24 000,- Kč
laboratorní práce a materiál	8 000,- Kč
Celková částka	32 000,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

V Liberci 9.4.2013

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Chotyňská, Donínská“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace 05/2013

Investor:

.....

zastoupený

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled
(k 9.4.2013)**

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	30	13 500, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	16	7 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	30	9 000, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	16	4 800, 00 Kč
				34 500, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	7000, 00 Kč
			10 000, 00 Kč

práce archeologů	34 500,- Kč
laboratorní práce a materiál	10 000,- Kč
Celková částka	44 500,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

V Liberci 9.4.2013

Příloha č.2: Kalkulace nákladů archeologického dohledu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11,
Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace

Akce: „Puškinova“, Liberec, (Liberecký kraj);

realizace od/2013

Investor:
.....
zastoupený

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum a dohled (k 9.4.2013)

(konečné ceny – Sč.muzeum v Liberci není plátcem DPH)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	počet hodin	celkem
archeolog (terén)	1	450	20	9 000, 00 Kč
archeolog (zpracování a vyhodnocení)	1	450	16	7 200, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (terén)	1	300	16	4 800, 00 Kč
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	1	300	16	4 800, 00 Kč
				25 800, 00 Kč

Materiál a služby			
	popis položky	rozpis	částka
1	základní materiál a fotopráce	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap.	3000, 00 Kč
2	geodetické zaměření	vybrané řezy a okraje plochy	5000, 00 Kč
			8 000, 00 Kč

práce archeologů	25 800,- Kč
laboratorní práce a materiál	8 000,- Kč
Celková částka	33 800,- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: 739572466

V Liberci 9.4.2013
